

DELTEXPLANNEWS

Bulletin d'information mensuel d'entreprise

Rédactrice: TEXIER Faustine - Marketing & Communication

GYMNASE PRÉ SAINT-JEAN



SOMMAIRE

- 1** P.3
**GYMNASE PRÉ SAINT-JEAN
BUC**
- 2** P.4
**HALLE AUX BLÉS
CLERMONT-FERRAND**
- 3** P.5
**CINÉMA ALICE GUY
BOBIGNY**
- 4** P.7
**PISTE CYCLABLE
LIBÉRATION NORD
CLERMONT-FERRAND**

1 GYMNASSE PRÉ SAINT-JEAN Buc

INTERVENTION

DELTEXPLAN est intervenu en tant qu'OPC dans le cadre d'un projet de rénovation et d'une extension du gymnase du Pré Saint-Jean. Ces améliorations modernisent les installations sportives du gymnase, qui propose diverses activités sportives telles que le basket-ball, le volley-ball, le handball, et le futsal. Le complexe sportif comprend également des terrains de tennis et une salle multisports équipée pour accueillir jusqu'à 300 spectateurs.

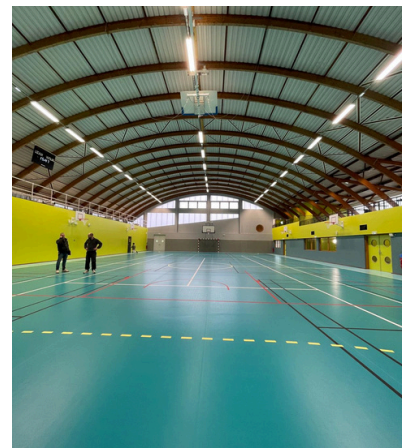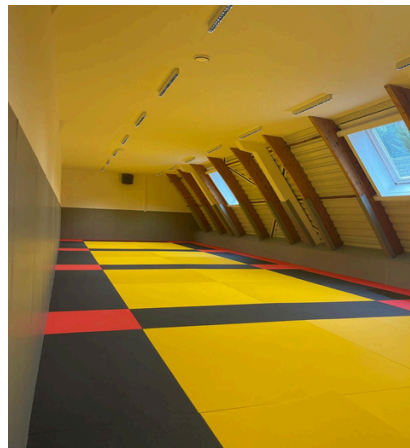

Gymnase Pré Saint-Jean à Buc - photo DELTEXPLAN

LIVRAISON

Un grand merci à toute l'équipe et aux entreprises qui nous ont aidés pour la livraison de ce chantier. Grâce au

dévouement et au professionnalisme, nous avons pu mener à bien ce projet dans les délais impartis. Huit lots sur le chantier divers travaux comme le gros œuvre - ECB, la charpente-THERMOSANI, la couverture-SARMATES & KALZIP, la menuiserie-SOS MURS RIDEAUX, la peinture-SPORTINGSOLS, l'électricité-DERICHERBOURG, la plomberie_CVC-TOURNOIS, et l'installation d'un ascenseur-ERMHES.

MOA : VILLE DE BUC

MOE : NOVAK & MENIER

DURÉE : 2023-2026

ASSURÉ PAR : M. Farid LAMANI

2 HALLE AUX BLÉS

Clermont - Ferrand

INTERVENTION

DELTEXPLAN intervient en tant qu'OPC dans le cadre du projet d'installation du FRAC (*Fond Régional d'Art Contemporain*) Auvergne au sein de la Halle aux Blés, bâtiment ancien classé monument historique.

Le projet vise à adapter ce patrimoine d'environ 2 500 m² aux usages d'un équipement culturel contemporain, avec la reconfiguration des espaces, l'amélioration de l'accueil du public et une rénovation technique complète, tout en valorisant un bâtiment patrimonial majeur porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

MOA : RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MOE : IN6TU ARCHITECTES

DURÉE : 2025 - 2026

ASSURÉ PAR : M. Jamal BOURCHOUK

AVANCEMENT DES TRAVAUX



Halle aux Blés Clermont-Ferrand - photo DELTEXPLAN

- Pose des luminaires au R+4 - en cours ;
- La dépose des échafaudages - en cours ;
- Pose des vitrines de la zone d'accueil est en cours ;
- La pose des cimaises fixes dans la salle d'exposition 1 est en cours ;
- La mise en peinture des cloisons et cimaises au R2 est en cours ;
- Préparation pour la peinture des plafonds en cours ;
- Travaux de sols du R+2 - en attente ;
- La pose des cimaises fixes au RDC est en cours ;
- La pose de l'ossature de plafond acoustique de la salle d'exposition 5 est en cours ;
- La pose des dalles avec la préparation et la mise en peinture de la première couche est en cours ;
- La pose de l'ossature périphérique des vitrines au RDC est en cours ;
- La mise en peinture du plafond acoustique de la salle d'exposition 7 - terminé ;
- La pose des cimaises fixes - en attente ;
- La pose des dalles de plafond acoustiques de la salle d'exposition 5 - en attente.



3 CINÉMA ALICE GUY

Bobigny

INTERVENTION

DELTEXPLAN intervient en tant qu'OPC dans le cadre d'un projet d'aménagement intérieur de six salles de cinéma dans le vaste projet de reconstruction du centre-ville de Bobigny. Le cinéma, situé dans un bâtiment de quatre étages, comprendra des salles de projection, un hall d'entrée, un café, une salle polyvalente, des bureaux et espaces techniques, ainsi qu'un espace dédié aux événements.



Le nom d'**Alice Guy**, réalisatrice française, a été choisi pour représenter le nouveau cinéma avec 36,3 % des voix des habitants de Bobigny.

EST ENSEMBLE
CINEMA DE BOBIGNY
CINE ALICE GUY

(liens article, site AMO)

Cinéma Alice Guy à Bobigny
photo DELTEXPLAN

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Sous-Sol 2

- Pose des tissus - fait ;
- Poser les habillages au niveau des trémies - en cours ;
- Montage de la cloison - en cours ;
- Pose organe GTB* - en cours ;
- Certificat CE. - en attente.

*Systèmes de gestion technique du bâtiment

Salle 6

- Pose des fauteuils - en cours ;
- Pose des rubans LED ;
- Pose (vantelle, vérin, bande d'accueil...) - en attente ;
- Poser la porte du local - en attente ;
- Mise en service de la CTA - fait ;
- Travaux moquettes- en cours.

• Salles 3-4-5-1

- Pose des tissus - fait ;
- Mise en service aéraulique - fait ;
- Pose des fauteuils - fait ;
- Mise en service du local CTA - fait ;
- Pose écran salle 4 - terminée ;
- Approvisionnement écran salle 5 - terminé.

• Sous-Sol 1 - Sanitaires

- pose du tissus - fait ;
- Joints carrelage et faïence - fait ;
- Pose cloisons sanitaires - fait ;
- Pose des appareillages sanitaires - fait.

Salle 2

- Pose des habillages bois ;
- Pose des dalles acoustique ;
- Pose des moquettes ;
- Pose des tribunes ;
- Mise en service du local CTA.

SAS + REGIE des Salles 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Pose des équipements - à venir (1,2,3,5) ;
- Intervention sur la fibre en régie ;
- Pose des châssis - en attente (1,6) ;
- Réglages scéniques en cours.

• Hal du RDC + sanitaires

- Montage de la grande cerce - fait ;
- Pose carrelage + Faïence dans les sanitaires - fait ;
- Les calfeutremments des réseaux - fait ;
- Finitions serrurerie escalier mécanique - en cours ;
- Pose des appareillages sanitaires - fait ;
- Finition des peintures du hall - en cours ;
- Pose des écrans de communication en cours.



SALLE 1

MOA : ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL – EST ENSEMBLE
MOE : HERAULT ARNOD ARCHITECTURE
DURÉE : 2023 - 2026
ASSURÉ PAR : M. FARID LAMANI



SANITAIRE



RÉGGIE S2




RDC



SALLE 3



SALLE 4

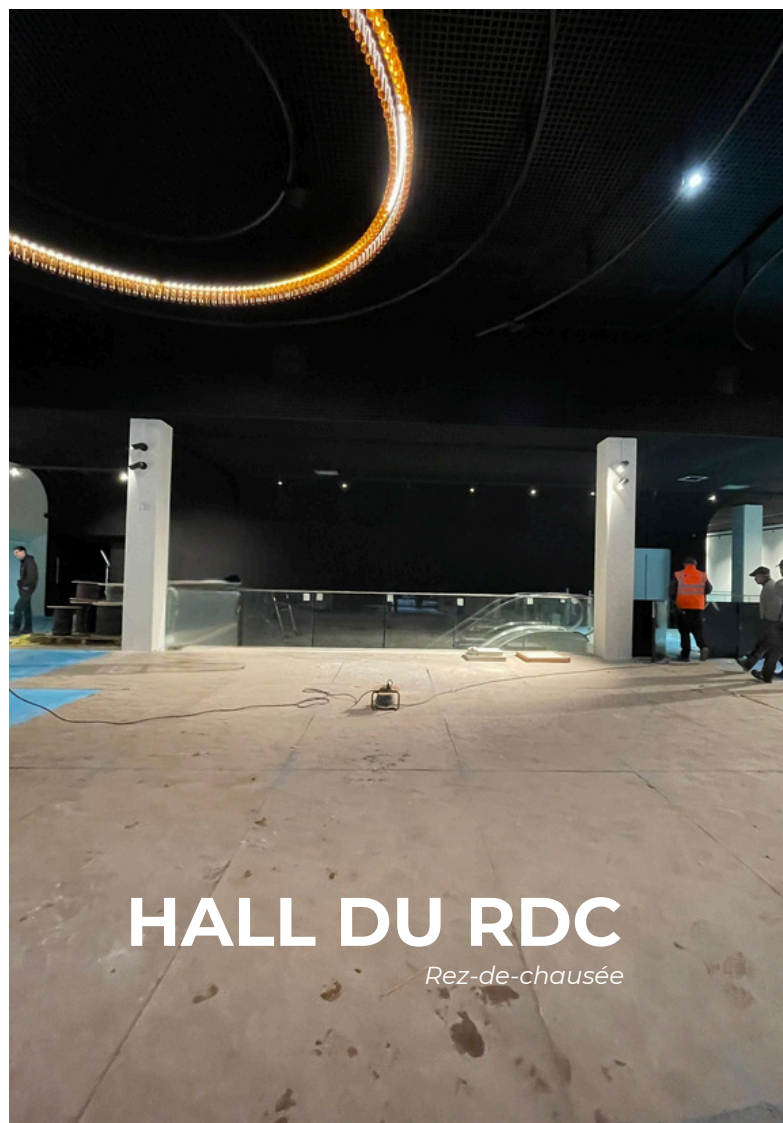

HALL DU RDC

Rez-de-chaussée

4 PISTE CYCLABLE LIBÉRATION NORD Clermont-Ferrand

INTERVENTION

Deltexplan intervient en tant qu'OPC dans le cadre d'un chantier qui concerne les voies EST et OUEST, y compris les carrefours entre les avenues Charles de Gaulle, Pasteur et Coubertin. La piste cyclable bidirectionnelle est réalisée tout en maintenant et rétablissant la circulation des bus, avant la création des trottoirs EST et OUEST, afin de garantir la sécurité, la fluidité des déplacements et la continuité des services.

Deltexplan accompagne la réalisation d'une piste cyclable sécurisée rue de la Libération Nord en assurant la coordination et l'organisation des travaux entre l'ensemble des acteurs du projet.

Notre intervention a permis de planifier et d'harmoniser les actions des différents intervenants : travaux de voirie, aménagements paysagers, éclairage public, feux tricolores, ainsi que les services de la Ville et des transports.



Piste cyclable Libération Nord à Clermont-Ferrand - photo DELTEXPLAN

MOA : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

MOE : ML2A

DURÉE : 2025 - 2026

ASSURÉ PAR : M. Jamal BOURCHOUK



Mise en service des feux et mise en circulation définitive de l'avenue de la Libération.

